

# Sondaggio: Sp2-new

Committente: ENEL GREEN POWER

Oggetto: Frana vapordotto S. Paolo - Partita 30

Site: Larderello



EST: 654297.018 m E

NORD: 4789041.199 m N

Quota: 515,61 m s.l.m.

Profondità: 30 m

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127


Sonda: CMV900

Installazione: Cella casagrande

Data esecuzione: 05.11-11.11.2019

Sondatore: Botto M

Geologo: Panvini G.

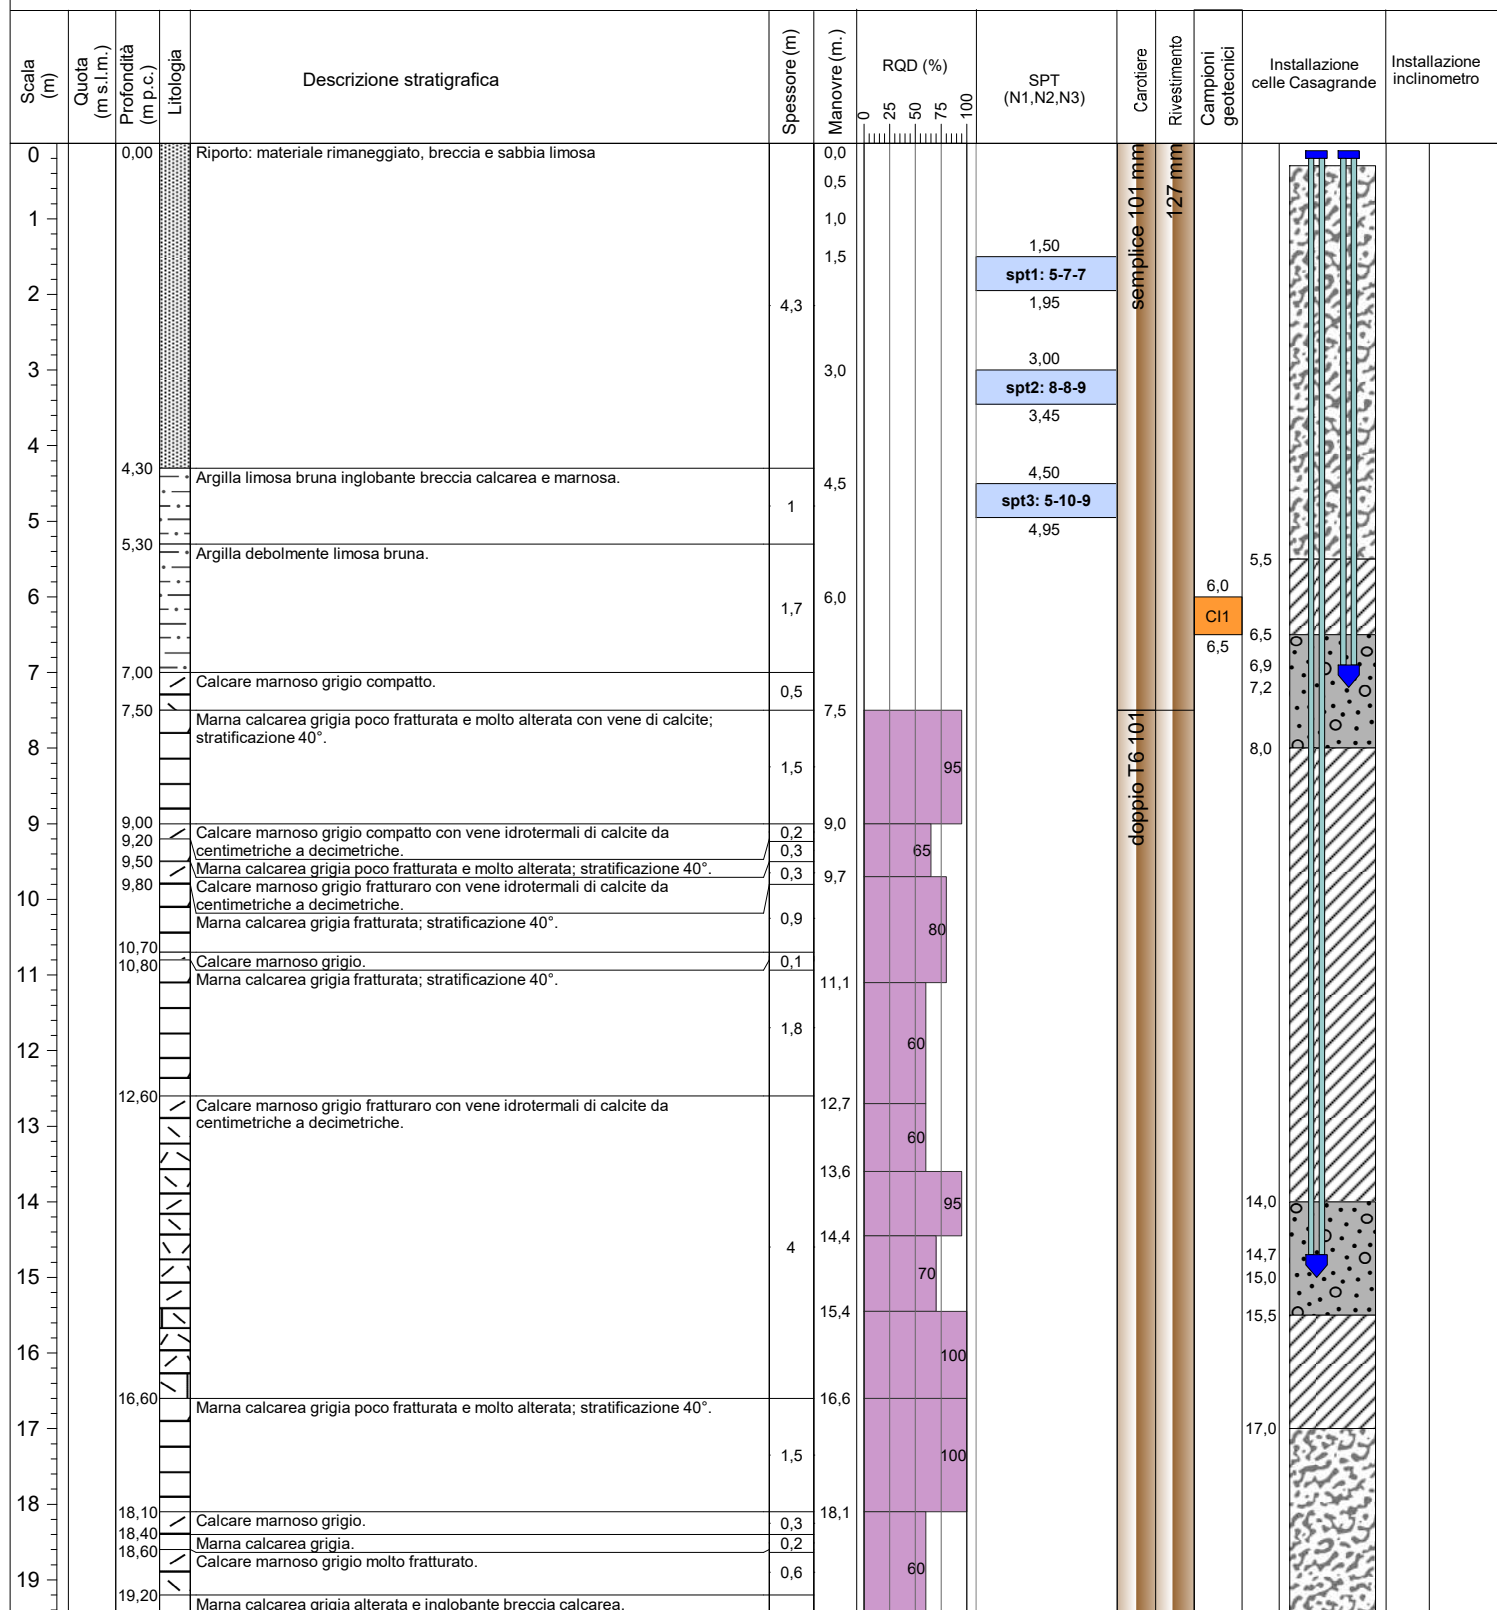

Legenda installazione inclinometro

- tappo di testa
- miscela ternaria
- tubo inclinometrico

Legenda installazione celle Casagrande

- Miscela ternaria
- Bentonite
- Ghiaietto
- Tappo di testa
- Tubo cieco
- Cella casagrande

# Sondaggio: Sp2-new

Committente: ENEL GREEN POWER

Oggetto: Frana vapordotto S. Paolo - Partita 30

Site: Larderello



Tecno In S.p.A.  
Via G. Marcora 52  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

EST: 654297.018 m E

NORD: 4789041.199 m N

Quota: 515,61 m s.l.m.

Profondità: 30 m

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Sonda: CMV900

Installazione: Cella casagrande


Data esecuzione: 05.11-11.11.2019

Sondatore: Botto M

Geologo: Panvini G.

Scala (m)	Quota (m s.l.m.)	Profondità (m p.c.)	Litologia	Descrizione stratigrafica	Spessore (m)	Manovre (m.)	RQD (%)	SPT (N1,N2,N3)	Carotiere	Rivestimento	Campioni geotecnici	Installazione celle Casagrande	Installazione inclinometro
20					1,4	19,6	90						
21	20,60			Calcare marnoso grigio.	0,2								
	20,80			Marna calcarea grigia.	0,2								
	21,00			Calcare marnoso grigio.	0,35	21,0	70						
	21,35			Marna calcarea grigia fratturata, alterata e degradata inglobante breccia calcarea.									
22					2,05	22,3	90						
23						23,3							
	23,40			Marna calcarea grigia.									
24					1,1		60						
	24,50			Calcare marnoso grigio fratturato.	0,35	24,5							
25	24,85			Marna calcarea grigia.			70						
					0,3								
26						26,0	50						
	26,15			Calcare marnoso grigio poco fratturato fratturato con vene idrotermali di calcite.									
27						27,4	70						
28					3,85	28,0	100						
						28,7	95						
29													
30	30,00					30,0						30,0	

## Legenda installazione inclinometro



## Legenda installazione celle Casagrande

